

日立新庁舎建設工事

進捗状況 No.6

2015年8月30日現在

今月から新庁舎の地下部分の掘削工事に着手しました。

ご来庁の皆様にご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。



■全体工事風景 その1

南側から工事現場を見ています。




■ディープウェル工事（仮設井戸による排水）

掘削工事を円滑に進めるため、仮設の井戸を設置して、地下水を場外に排水しています。
（写真は井戸の設置状況）



■掘削工事

新庁舎の地下部の掘削工事をを行っています。地下階や免震装置の設置のため、約9mの深さまで掘削します。（8月末現在約3m掘削）

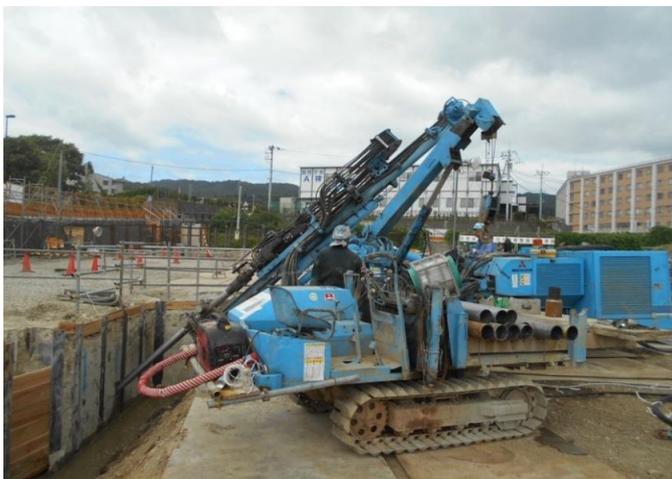

■地盤アンカー設置工事

掘削工事のために設置した擁壁が自立できるよう、擁壁の背面に地盤アンカーを埋め込んでいます。



■残土搬入地（かみね公園）の整備

新庁舎建設工事に伴い発生する残土の一部は、かみね公園駐車場整備のために使用することとしています。現在、残土搬入のための仮設工事を実施しています。
