

日上市新庁舎建設工事

進捗状況 No.9

2015年11月30日現在
(進捗率 10.40%)

新庁舎建設事業は、現在基礎部分の工事を行っています。


基礎となるコンクリートは約7,600m³（コンクリートミキサー車約2,000台分）を12回に分けて打設します。

多くのコンクリートミキサー車が入り出ることとなり、ご来庁の皆様にご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

(工事期間 H27.3～H29.4、供用開始予定 H29.8)



■全体工事風景
南側から工事現場を見ています。

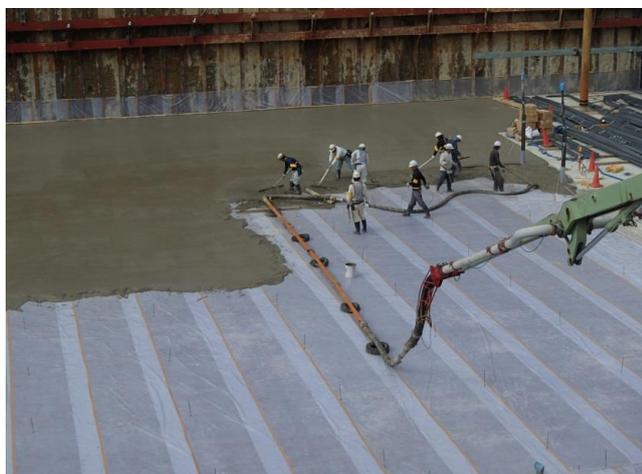

■捨てコンクリート工事

地表から約9m掘削した後、砕石を敷き均し、シートを貼り、捨てコンクリートを打設します。捨てコンクリートは、鉄筋工事を行う位置を明示するために打設するものです。



■基礎の鉄筋工事

新庁舎の基礎は厚み1.7mの鉄筋コンクリート造です。基礎の上側と下側に鉄筋を格子状に組んでいます。



■基礎のコンクリートの打設工事

厚み1.7mの基礎を作るため、ポンプ車を利用して基礎用のコンクリートを流し込んでいます。



■定例工事打合せの様子

施工工程及び方法等を定めるため、設計者や施工者が現場事務所に集まって、毎週定期的な打合せを行っています。
