

## 日上市新庁舎建設工事

# 進捗状況 No.14

2016年4月30日現在  
(進捗率 26.30%)

新庁舎建設工事は、鉄骨の組立てが一部5階まで進んでいます。

大型のクレーンを利用して鉄骨を高層階まで吊り上げ、工事が行われています。


鉄骨工事では、階段の設置やエレベーター設置のための枠などの組立も行われています。

(工事期間 H27.3~H29.4、供用開始予定 H29.8)



### ■全体工事風景

南側から工事現場を見ています。

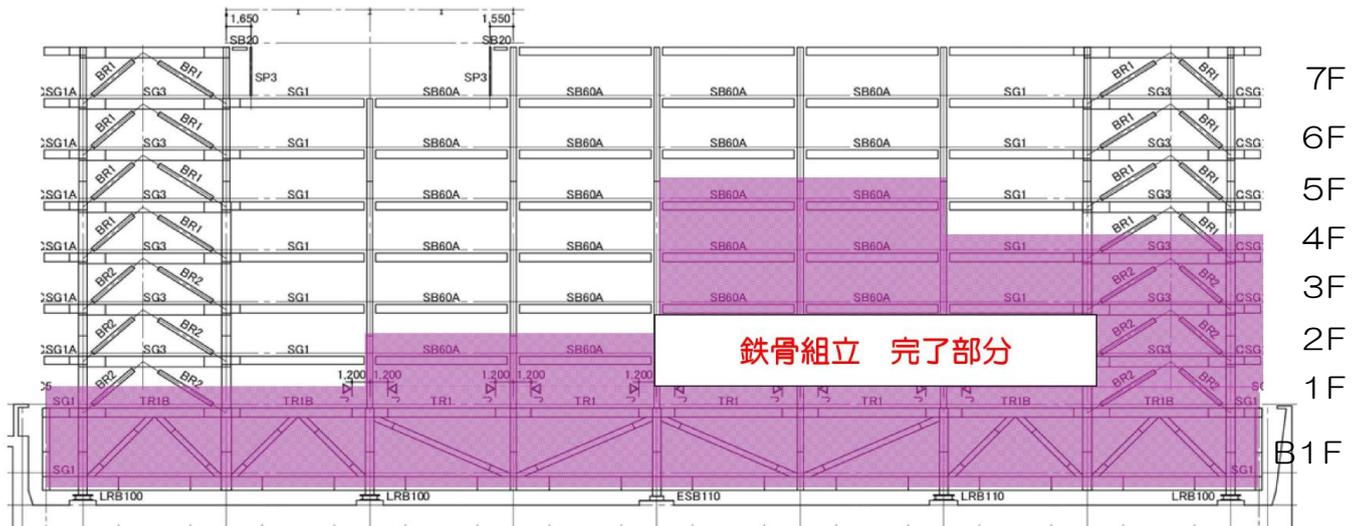

### ■鉄骨組立完了範囲

東側から見た鉄骨組立完了部分を示しています(着色部分)。  
鉄骨の組立てが完了するのは7月末の予定です。



### ■鉄骨の組立の様子

5月末までに一部5階までの鉄骨を組み上げます。  
5階は、地上からの高さ約15mとなります。



### ■階段設置工事

新庁舎内の北側と南側には、階段室や仮設エレベーターを設置します。
