

日上市新庁舎建設工事

進捗状況 No.21

2016年11月30日現在
(進捗率 77.20%)

新庁舎建設工事は順調に進んでいます。高層階では内装工事が進み、仕上げの塗装作業が始まりました。低層階では外装工事と内装工事を行っています。屋内広場の屋根工事や設備用の配管を地中に埋設する外構工事も進んでいます。

今後は、各階において内装工事及び天井・壁・床の仕上げ工事を行い、その後、設備機器類の取付けが始まります。

(工事期間 H27.3~H29.4、供用開始予定 H29.7)




■全体工事風景
南側から工事現場を見ています。



■屋内広場の屋根工事
屋根の仕上げ材を取付けるための下地を施工しています。仕上げ材にはガルバリウム鋼板というアルミと亜鉛の合金メッキ鋼板を使用します。



■階段の塗装工事
写真の薄茶色部分は壁ボードの継目処理を行ったものです。その後、塗装を行うと写真上部のようにきれいな仕上がりになります。

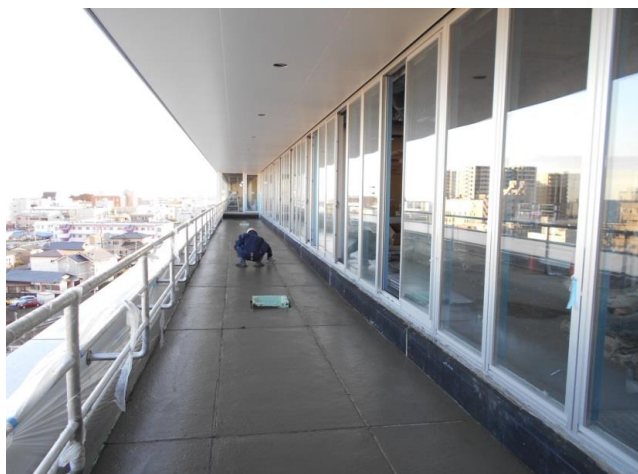

■バルコニーの床仕上げ
水が自然に排水口へ流れるように床のコンクリートは勾配をつけて仕上げています。



■会議室のガラス間仕切り工事
ガラスの間仕切りを設置後、色合いを確認しながら壁や天井の塗装をしています。
