新庁舎建設市民懇話会資料１
平 成 ２ ８ 年 １ １ 月 ２ 日
総　　務　　部

第１期本体工事の進捗状況について（全体スケジュール）

	平成26年度	平成27年度												平成28年度												平成29年度				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
各月末の工事進捗率（%）		0.34	0.73	2.42	4.45	5.70	6.80	7.80	10.40	13.30	16.30	20.20	20.50	26.30	29.90	35.40	43.20	52.50	62.20	70.40						(100.00)				
準備工	準備	支障物件撤去・下水管敷設等																											新庁舎供用開始（H29.8～）	
土工					掘削工事																									
地下躯体									基礎・擁壁・免震装置工事																					
地上躯体														鉄骨・コンクリート工事																
外装																	外装工事													
内装																				内装工事										
設備																				電気・空調・給排水設備工事										
外構																						外構工事								
検査																									検査					

※　各月末の工事進捗率（%）の欄中、（　　）内は見込みの進捗率
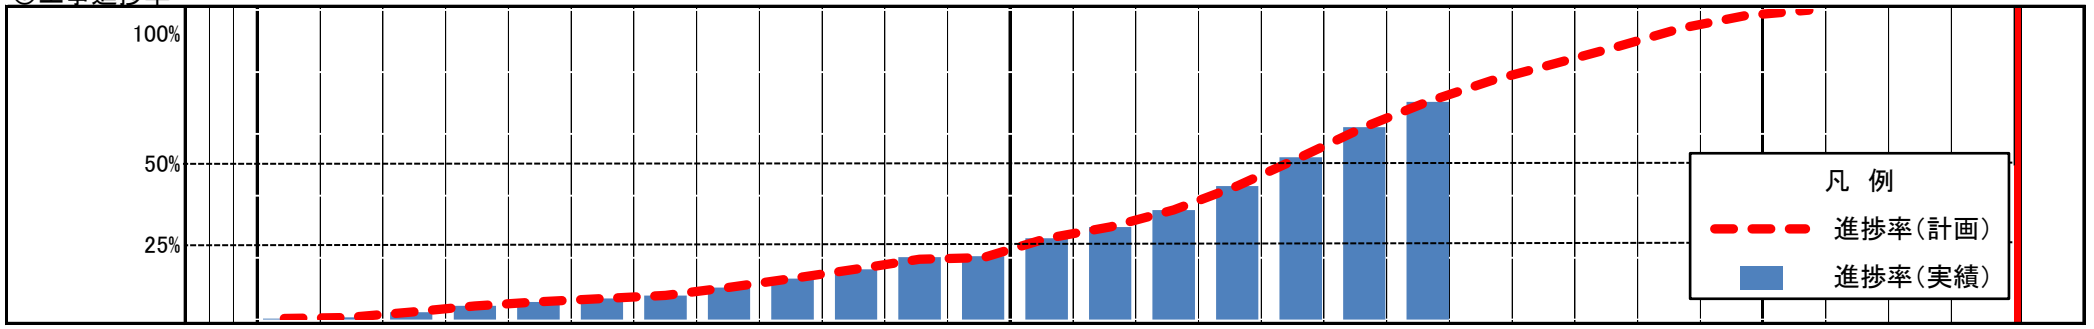
◎工事進捗率
